



Entreprise Lorraine de Maintenance

# DEMANDE DE MISE EN SERVICE

Demandeur :

Cachet :

Entreprise :  
Personne à contacter :

Tél :  
Date :

Nom et adresse de **facturation** si différents du demandeur :

**A renvoyer au secrétariat :**  
[secretariat@becker-tourscher.fr](mailto:secretariat@becker-tourscher.fr)

Code interne \*:  
(\*partie réservée au secrétariat)

## Lieu d'intervention :

Nom de l'utilisateur : \_\_\_\_\_ Personne à contacter : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Code postal : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_ Tél : \_\_\_\_\_

## Informations sur le système à mettre en service :

Type de produit :  Pompe à chaleur  Climatisation  Autre \_\_\_\_\_

Marque : \_\_\_\_\_ Modèle : \_\_\_\_\_

N° de série : \_\_\_\_\_ Année : \_\_\_\_\_

## Configuration de l'installation :

Présence d'un ballon tampon :  oui  non

Production d'ECS :  oui  non

Avec système de charge :  oui  non

L'installation est-elle couplée  
à une chaudière (appoint) :  oui  non

Si oui, précisez le type de chaudière : \_\_\_\_\_

Avec régulation sur sonde extérieure :  oui  non

L'installation est-elle couplée  
à un système solaire :  oui  non

Si oui, précisez le type de régulation : \_\_\_\_\_

L'unité extérieure de la pompe à chaleur est-elle :  
 posée au sol  montée à plus de 1m50

## **IMPERATIF :**

Longueur de la tuyauterie (en mètres) : \_\_\_\_\_ Point de bivalence ( si existant ) : \_\_\_\_\_

Déperditions (en Kw) : \_\_\_\_\_ T° max CC1 / CC2 / CC3 par -10°C : \_\_\_\_\_

### PARTIE HYDRAULIQUE :

Mise en eau et purge effectuées côté secondaire  
(chauffage) :  oui  non

Schéma hydraulique :  circuit direct  
 circuit mélangé

Rafraîchissement :  circuit direct  
 circuit mélangé  
 circuit ventilo-convecteur

### PARTIE ELECTRIQUE :

Tension présente avec abonnement adapté :  
 oui  non Puissance abonnement : \_\_\_\_\_ KVA  
Nature :  monophasé  triphasé

Mise en place des sondes de température :  
 oui  non

Mise en place des conduites frigorifiques obturées  
en attente (qualité frigorifique NF EM 12735) :  
 oui  non **(Voir photos ci-dessous)**


## IMPORTANT !

- ❖ La présence de l'installateur ou d'un technicien le représentant est impérative pour la mise en service
- ❖ L'installation doit être opérationnelle ( raccordements hydraulique et électriques effectués ).
- ❖ L'installation doit être facilement accessible et disposer des équipements de sécurités nécessaires.
- ❖ L'intervention d'un technicien se limite à la mise en service ou au dépannage et non au contrôle de conformité de l'installation qui reste de la responsabilité de l'installateur.
- ❖ La date d'intervention est confirmée par notre secrétariat.
- ❖ Les mises en service sont réalisées sous 10 Jours ouvrés maximum.
- ❖ L'intervention d'un technicien n'entraîne aucun transfert de responsabilité dans le cadre de la garantie due par l'installateur à l'utilisateur.

### Les prestations comprises dans la mise en service sont les suivantes :

- Dudgeonnage et raccordement des conduites frigorigifiques **EN ATTENTE** sur l'unité intérieure et extérieure ;
- Test d'étanchéité et pression sous azote sec ;
- Tirage au vide ;
- Remplissage et complément éventuel en réfrigérant R410A dans la limite de 150 Grammes pour les mise en service Viessmann (pour les autres cas, une facturation sera faite) ;
- Recherche de fuite avec détecteur de fuite conformément à NF EN 14624 5g/an ;
- Etablissement de la fiche de contrôle d'étanchéité et mise en service d'installation frigorigifique ;
- Paramétrage et programmation de la régulation ;
- Contrôle de fonctionnement de l'installation en mode chaud et/ou froid selon la configuration ;
- Relevé et rédaction du procès-verbal de mise en service.

### **CONFORME :**

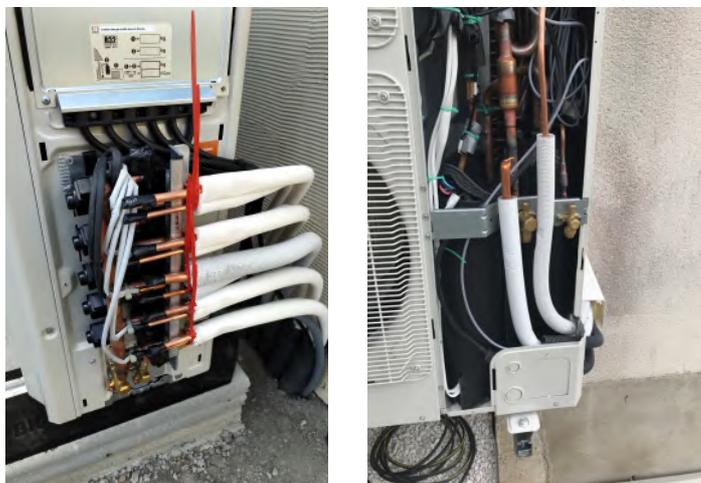

### **NON CONFORME :**



**ATTENTION ! Dans un souci d'efficacité et de réactivité, le présent formulaire doit être dûment complété afin d'être validé par notre secretariat.**

S.A.R.L au capital de 25000 euros

2b rue de la Fontaine, 57420 Pournoy-la-Chétive

RCS: 750 710 899 TVA intracommunautaire: FR 95 750 710 899 APE:4322B  
société enregistrée au RCS de Metz Banque: BPLC
